Chantier : MEZIERES SUR COUESNON
Date : Sam 04/11/17
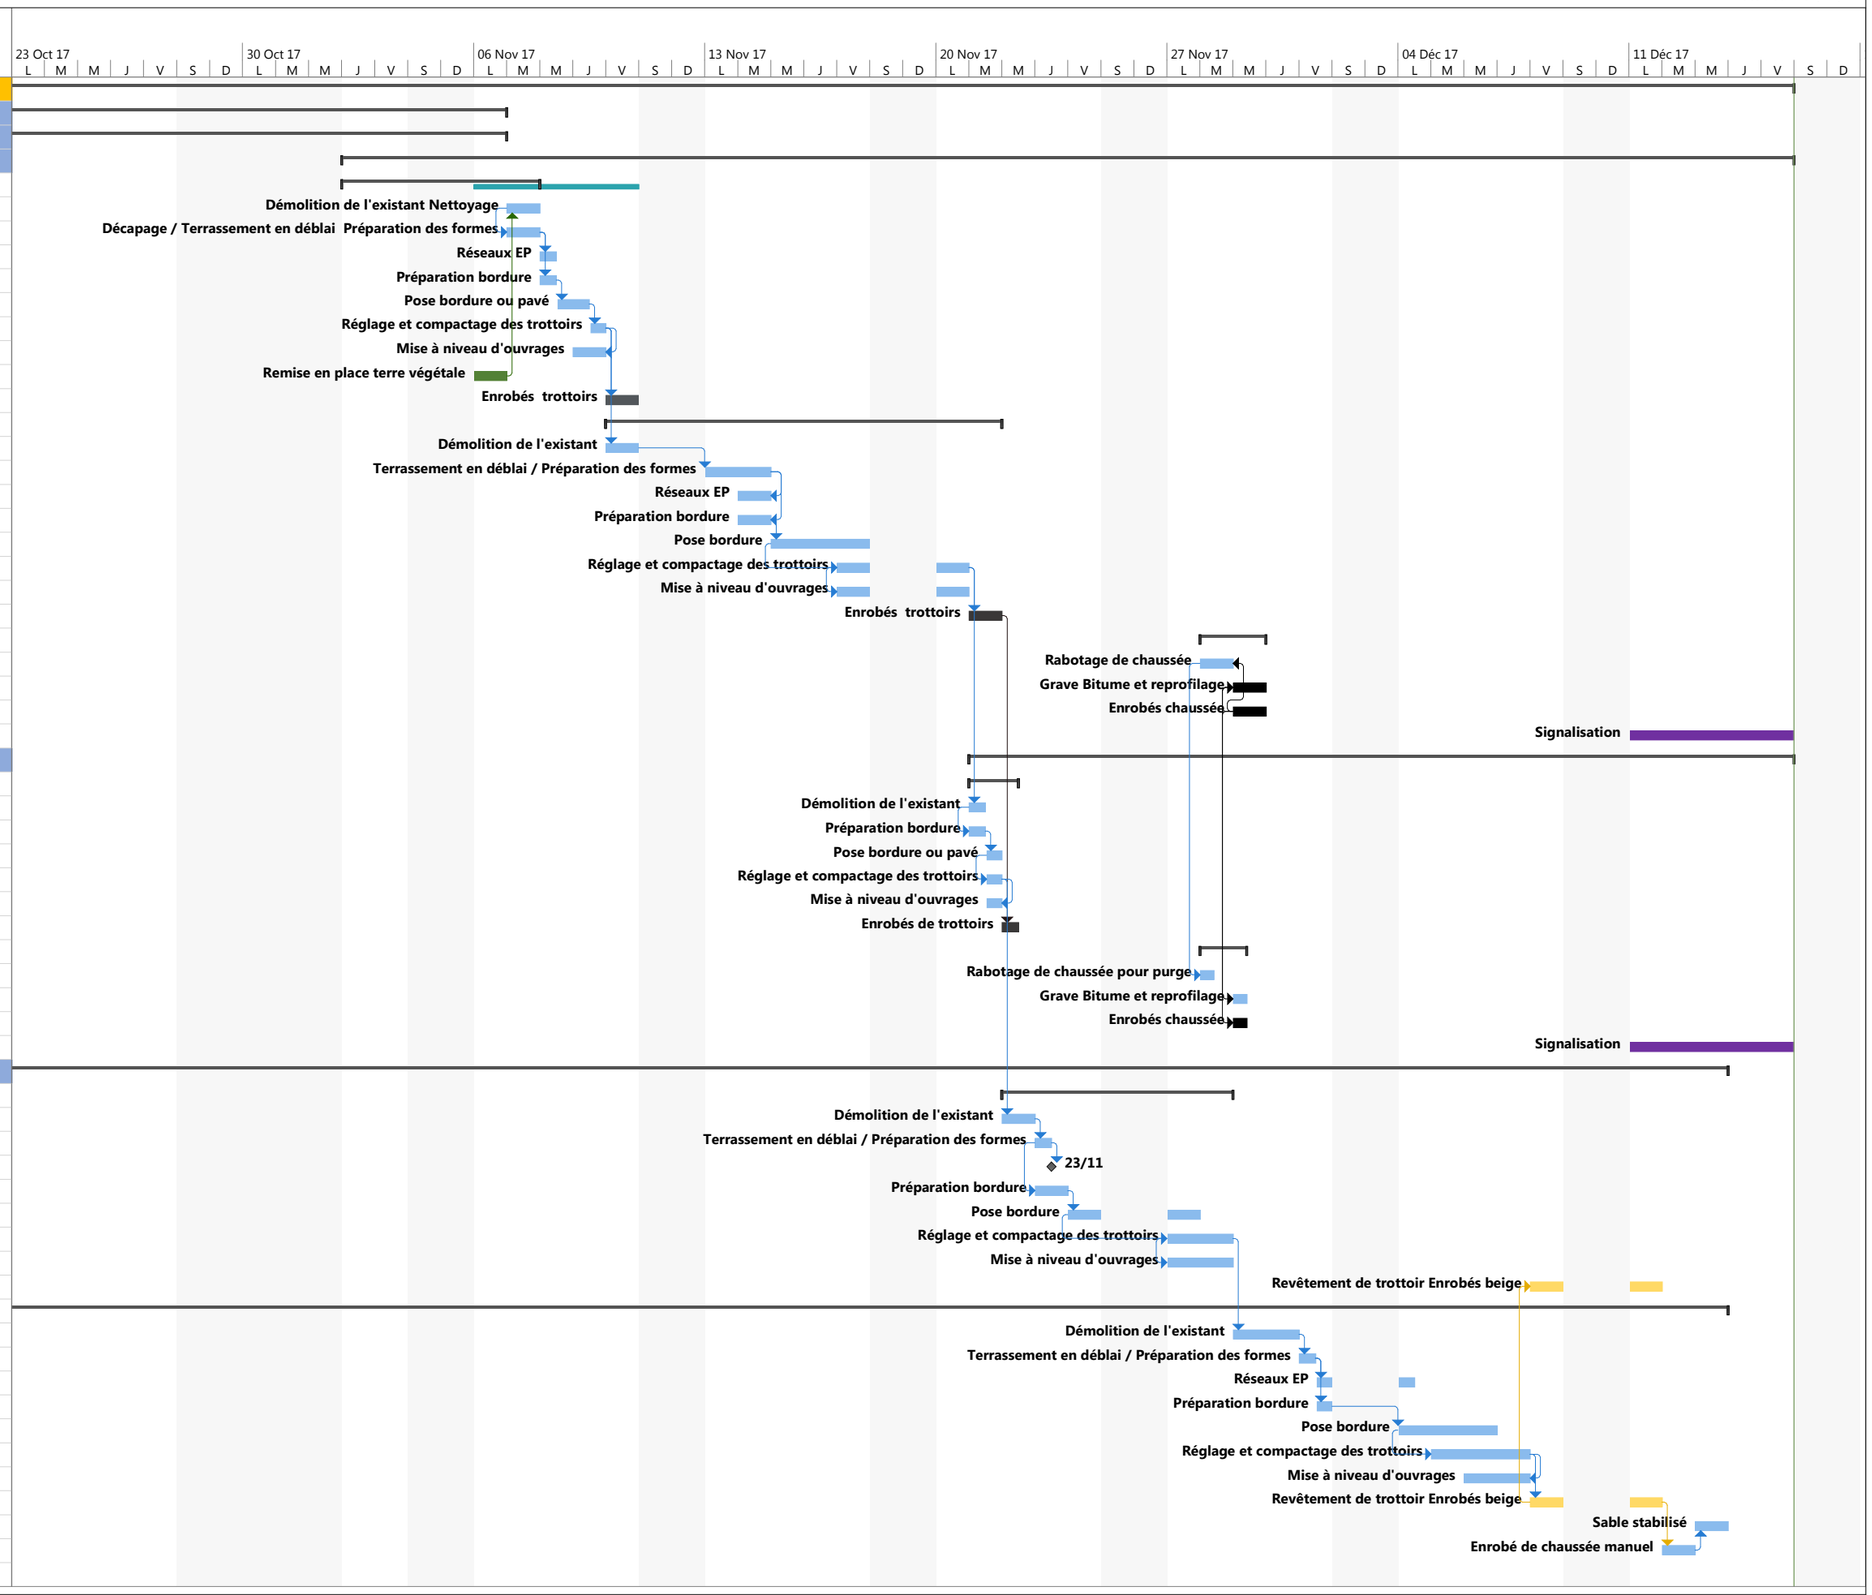
N°	Code	Nom de la tâche
0	0	**MEZIERES SUR COUESNON**
1	1	**Secteur H Rue de Saint Jean**
27	2	**Secteur C**
54	3	**Secteur F1 Carrefour lotissement**
55	3.1	**Rive OUEST**
56	3.1.1	Démolition de l'existant Nettoyage
57	3.1.2	Décapage / Terrassement en déblai Préparation des formes
58	3.1.3	Réseaux EP
59	3.1.4	Préparation bordure
60	3.1.5	Pose bordure ou pavé
61	3.1.6	Réglage et compactage des trottoirs
62	3.1.7	Mise à niveau d'ouvrages
63	3.1.8	Remise en place terre végétale
64	3.1.9	Enrobés trottoirs
65	3.2	**Rive EST**
66	3.2.1	Démolition de l'existant
67	3.2.2	Terrassement en déblai / Préparation des formes
68	3.2.3	Réseaux EP
69	3.2.4	Préparation bordure
70	3.2.5	Pose bordure
71	3.2.6	Réglage et compactage des trottoirs
72	3.2.7	Mise à niveau d'ouvrages
73	3.2.8	Enrobés trottoirs
74	3.3	**Chaussée**
75	3.3.1	Rabotage de chaussée
76	3.3.2	Grave Bitume et reprofilage
77	3.3.3	Enrobés chaussée
78	3.4	Signalisation
79	4	**Secteur D Cimetière**
80	4.1	**Rive OUEST**
81	4.1.1	Démolition de l'existant
82	4.1.2	Préparation bordure
83	4.1.3	Pose bordure ou pavé
84	4.1.4	Réglage et compactage des trottoirs
85	4.1.5	Mise à niveau d'ouvrages
86	4.1.6	Enrobés de trottoirs
87	4.2	**Chaussée**
88	4.2.1	Rabotage de chaussée pour purge
89	4.2.2	Grave Bitume et reprofilage
90	4.2.3	Enrobés chaussée
91	4.3	Signalisation
92	5	**Secteur E Centre de Loisirs**
93	5.1	**Rive OUEST**
94	5.1.1	Démolition de l'existant
95	5.1.2	Terrassement en déblai / Préparation des formes
96	5.1.3	Réseaux EP
97	5.1.4	Préparation bordure
98	5.1.5	Pose bordure
99	5.1.6	Réglage et compactage des trottoirs
100	5.1.7	Mise à niveau d'ouvrages
101	5.2	Revêtement de trottoir Enrobés beige
102	5.3	**Rive EST**
103	5.3.1	Démolition de l'existant
104	5.3.2	Terrassement en déblai / Préparation des formes
105	5.3.3	Réseaux EP
106	5.3.4	Préparation bordure
107	5.3.5	Pose bordure
108	5.3.6	Réglage et compactage des trottoirs
109	5.3.7	Mise à niveau d'ouvrages
110	5.3.8	Revêtement de trottoir Enrobés beige
111	5.3.9	Sable stabilisé
112	5.3.10	Enrobé de chaussée manuel
113	5.3.11
